



**CÔNG TY CPXD
CẦU THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 36./CV-CTH

Thanh Hóa, ngày 6..tháng 5... năm 2022

V/v: Thi công xây dựng Cầu Tuần Giang
thuộc gói thầu số 05: Thi công xây dựng và
bảo hiểm công trình thuộc dự án đường
giao thông từ khu công nghiệp Bim Sơn
đến đường bộ đoạn ven biển đoạn Nga Sơn
- Hoàng Hóa.

CÔNG VĂN BẢN

SỐ 77

NGÀY 09/5/2022

Kính gửi: Công ty CP Quản lý đường thủy nội địa và XDGT Thanh Hóa.

Căn cứ Hợp đồng xây dựng số: 07/2021/HĐXD ngày 29/12/2021 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa với Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Hải - Công ty Cổ phần xây dựng Cầu Thanh Hóa - Công ty Cổ phần Tân Thành - Công ty Cổ phần Xây dựng và TM Xuân Hưng về việc thi công xây dựng công trình Gói thầu số Gói thầu 05: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình. Dự án: Đường giao thông từ khu công nghiệp Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoàng Hóa;

Công ty cổ phần xây dựng cầu Thanh Hóa là đơn vị thi công hạng mục Cầu Tuần Giang – lý trình Km3+677,4 bắc qua sông Hoạt thuộc gói thầu số 05: Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình thuộc dự án đường giao thông từ khu công nghiệp Bim Sơn đến đường bộ đoạn ven biển đoạn Nga Sơn - Hoàng Hóa. Hiện nay nhà thầu đang chuẩn bị thi công, để đảm bảo yêu cầu về tiến độ thi công, bằng văn bản này **Công ty cổ phần xây dựng cầu Thanh Hóa** kính đề nghị **Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa** cho phép đơn vị thi công được xây dựng cầu tạm và đắp đất mặt bằng thi công mố trụ trong lòng sông như biện pháp thi công được duyệt. Thời gian bắt đầu thi công từ 15/04/2022 đến 23/12/2023.

Nhà thầu cam kết phá dỡ đường công vụ khi có mưa lũ xảy ra mà công trình thi công của nhà thầu gây ngập úng và thanh thải lòng sông theo đúng hiện trạng sau khi công trình cầu được hoàn thành.

Kính đề nghị quý công ty tạo điều kiện, giúp đỡ nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ thi công hạng mục cầu Tuần Giang – Km3+677,40 thuộc dự án: Đường giao thông từ khu công nghiệp Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoàng Hóa./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU




GIÁM ĐỐC

Đỗ Xuân Lam

Gói thầu số 05: Đường giao thông từ KCN Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoàng Hóa
Hạng mục: Cầu Tuần Giang Km3+677.40


ID	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	NGÀY BĐ	NGÀY KT
1	CẦU TUẦN GIANG KI34677.40	601 days	15/04/2022	23/12/2023
2	CHUẨN BỊ MẶT BẰNG, XÂY DỰNG LÁN TRẠI, HUY ĐỘNG MÁY MÓC THIẾT BỊ	20 days	15/04/2022	05/05/2022
3	CHUẨN BỊ MẶT BẰNG, XÂY DỰNG LÁN TRẠI, HUY ĐỘNG MÁY MÓC THIẾT BỊ	20 days	15/04/2022	05/05/2022
4	THI CÔNG ĐƯỜNG CÔNG VỤ, CẦU TẠM	66 days	15/04/2022	20/06/2022
5	Thi công đường công vụ phía mố M2	12 days	15/04/2022	26/04/2022
6	Thi công cầu tạm	10 days	15/05/2022	24/05/2022
7	Thi công đường công vụ phía mố M1	20 days	01/06/2022	20/06/2022
8	THI CÔNG MỐ M2	81 days	27/04/2022	17/07/2022
9	Đắp đất mặt bằng thi công mố	6 days	27/04/2022	03/05/2022
10	Thi công cọc khoan nhồi	30 days	04/05/2022	02/06/2022
11	Thi công kết cấu chính mố	45 days	03/06/2022	17/07/2022
12	THI CÔNG TRỤ T5	80 days	04/05/2022	22/07/2022
13	Đắp đất mặt bằng thi công	5 days	04/05/2022	08/05/2022
14	Thi công cọc khoan nhồi	30 days	09/05/2022	07/06/2022
15	Thi công kết cấu trụ	45 days	08/06/2022	22/07/2022
16	THI CÔNG TRỤ T4	85 days	08/06/2022	31/08/2022
17	Đắp đất mặt bằng thi công	10 days	08/06/2022	17/06/2022
18	Thi công cọc khoan nhồi	30 days	18/06/2022	17/07/2022
19	Thi công kết cấu trụ	45 days	18/07/2022	31/08/2022
20	THI CÔNG TRỤ T3	85 days	18/07/2022	11/10/2022
21	Đắp đất mặt bằng thi công	10 days	18/07/2022	27/07/2022
22	Thi công cọc khoan nhồi	30 days	28/07/2022	26/08/2022
23	Thi công kết cấu trụ	45 days	27/08/2022	11/10/2022
24	THI CÔNG TRỤ T2	85 days	27/08/2022	20/11/2022
25	Đắp đất mặt bằng thi công	10 days	27/08/2022	06/09/2022
26	Thi công cọc khoan nhồi	30 days	07/09/2022	06/10/2022
27	Thi công kết cấu trụ	45 days	07/10/2022	20/11/2022
28	THI CÔNG TRỤ T1	85 days	07/10/2022	30/12/2022
29	Đắp đất mặt bằng thi công	10 days	07/10/2022	16/10/2022
30	Thi công cọc khoan nhồi	30 days	17/10/2022	15/11/2022
31	Thi công kết cấu trụ	45 days	16/11/2022	30/12/2022
32	THI CÔNG MỐ M1	85 days	16/11/2022	20/02/2023
33	Đắp đất mặt bằng thi công	10 days	16/11/2022	25/11/2022
34	Thi công cọc khoan nhồi	30 days	26/11/2022	25/12/2022
35	Thi công kết cấu mố	45 days	26/12/2022	20/02/2023
36	THI CÔNG DẦM B33M	380 days	02/05/2022	31/05/2023
37	Sản xuất dầm bản trên bãi đất	320 days	02/05/2022	30/03/2023
38	Cầu lắp dầm vào vị trí	60 days	31/03/2023	31/05/2023
39	THI CÔNG KẾT CẤU PHẦN TRÊN	175 days	31/03/2023	24/09/2023
40	Thi công mặt cầu, gờ lan can	160 days	31/03/2023	09/09/2023
41	Thi công lan can, khe co giãn	15 days	10/09/2023	24/09/2023
42	THI CÔNG ĐƯỜNG HAI ĐẦU CẦU	60 days	25/09/2023	23/11/2023
43	Thi công đường hai đầu cầu	60 days	25/09/2023	23/11/2023
44	DỌN DẸP, THU DỌN CÔNG TRƯỜNG, BÀN GIAO	30 days	24/11/2023	23/12/2023
45	Dọn dẹp, thu dọn công trường, bàn giao	30 days	24/11/2023	23/12/2023

TRẮC DỌC ĐƯỜNG CÔNG VỤ, CẦU TẠM

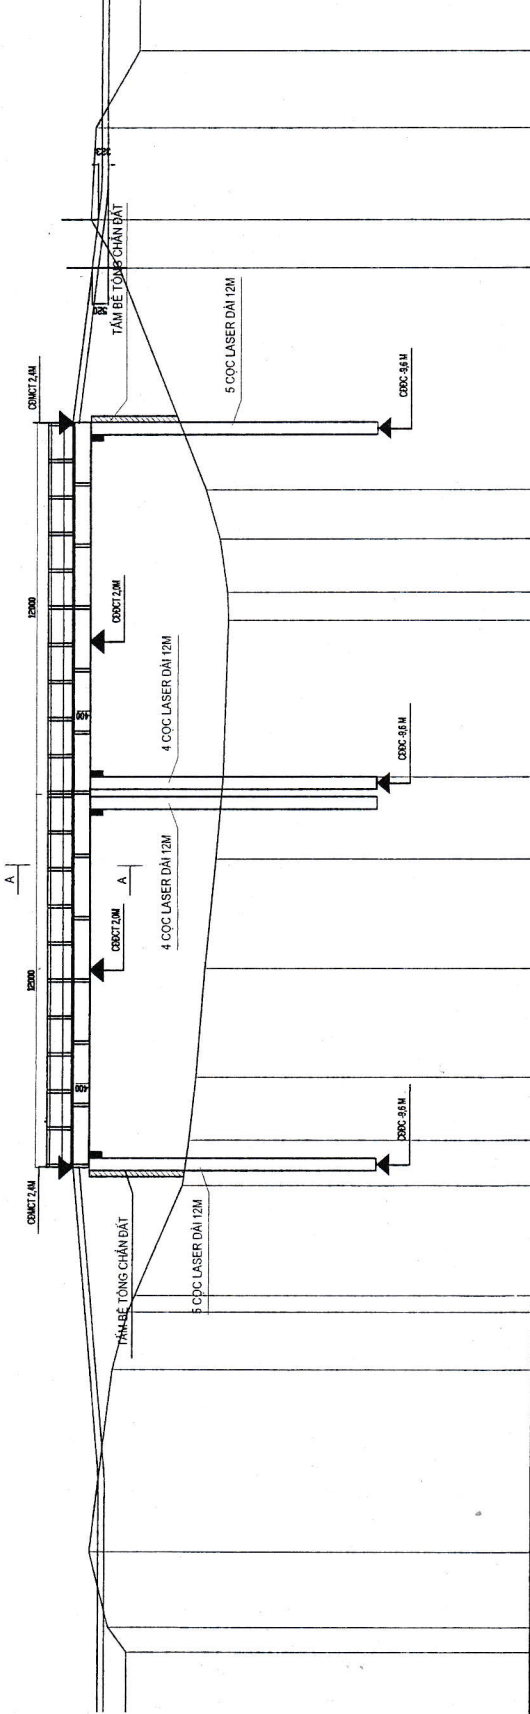

DỐC DỌC THIẾT KẾ	0%		3.5%		0%		7.4		8.7%		0%	
	0%	3.5%	0%	7.4	0%	8.7%	0%	7.4	8.7%	0%	0%	0%
* CAO ĐỘ TỰ NHIÊN	1.35	1.86	1.67	2.02	1.35	1.86	1.67	2.02	1.35	1.86	1.67	2.02
CAO ĐỘ THIẾT KẾ	1.35	1.86	1.67	2.02	1.35	1.86	1.67	2.02	1.35	1.86	1.67	2.02
KHOẢNG CÁCH LỀ	0.74	1.33	1.65	1.95	0.80	1.33	1.65	1.95	0.80	1.33	1.65	1.95
TÊN CỌC	M2											

MẶT CẮT NGANG CẦU TẠM (MẶT CẮT A-A)

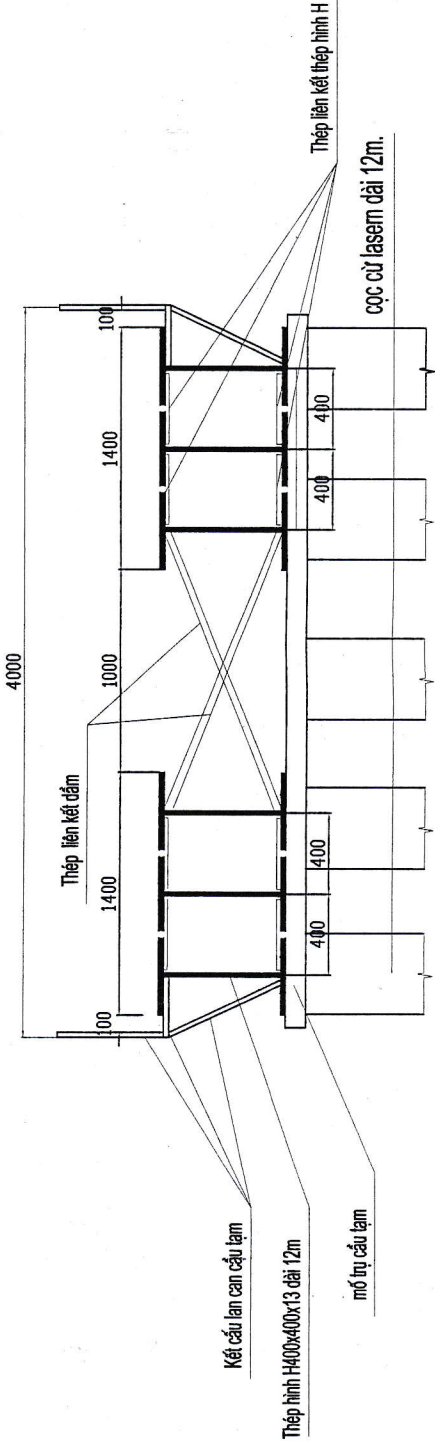


TÊN BẢN VẼ:	MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNG ĐƯỜNG TẠM CẦU TẠM	
TÝ LỆ:	LÀM XUẤT BẢN:	ĐIỀU CHỈNH:

DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG KẾT NỐI THỊ XÃ BÌM SƠN VÀ ĐƯỜNG BỘ	
VEN BIÊN ĐOẠN NGA SƠN - HOÀNG HÓA	
GỒI THẦU SỐ 05: THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH	
HẠNG MỤC ĐƯỜNG TẠM, CẦU TẠM CẦU TẠM GIANG - LÝ TRÌNH KM3+677.4	

NHÀ THẦU XÂY LẬP : CÔNG TY CPXD CẦU THANH HÓA			
CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	NGÀY / THÁNG / NĂM
THỰC HIỆN	HOÀNG CÔNG THỦY	<i>thuy</i>	
KIỂM TRA	HÀN MINH HIỂU	<i>han</i>	

CHỦ ĐẦU TƯ	UBND TỈNH THANH HÓA		
	N QLDA ĐT CÔNG TRÌNH		
	AO THÔNG THANH HÓA		

MẶT BẰNG ĐƯỜNG TẠM, CẦU TẠM CẦU TUẦN GIANG KM3+677.40

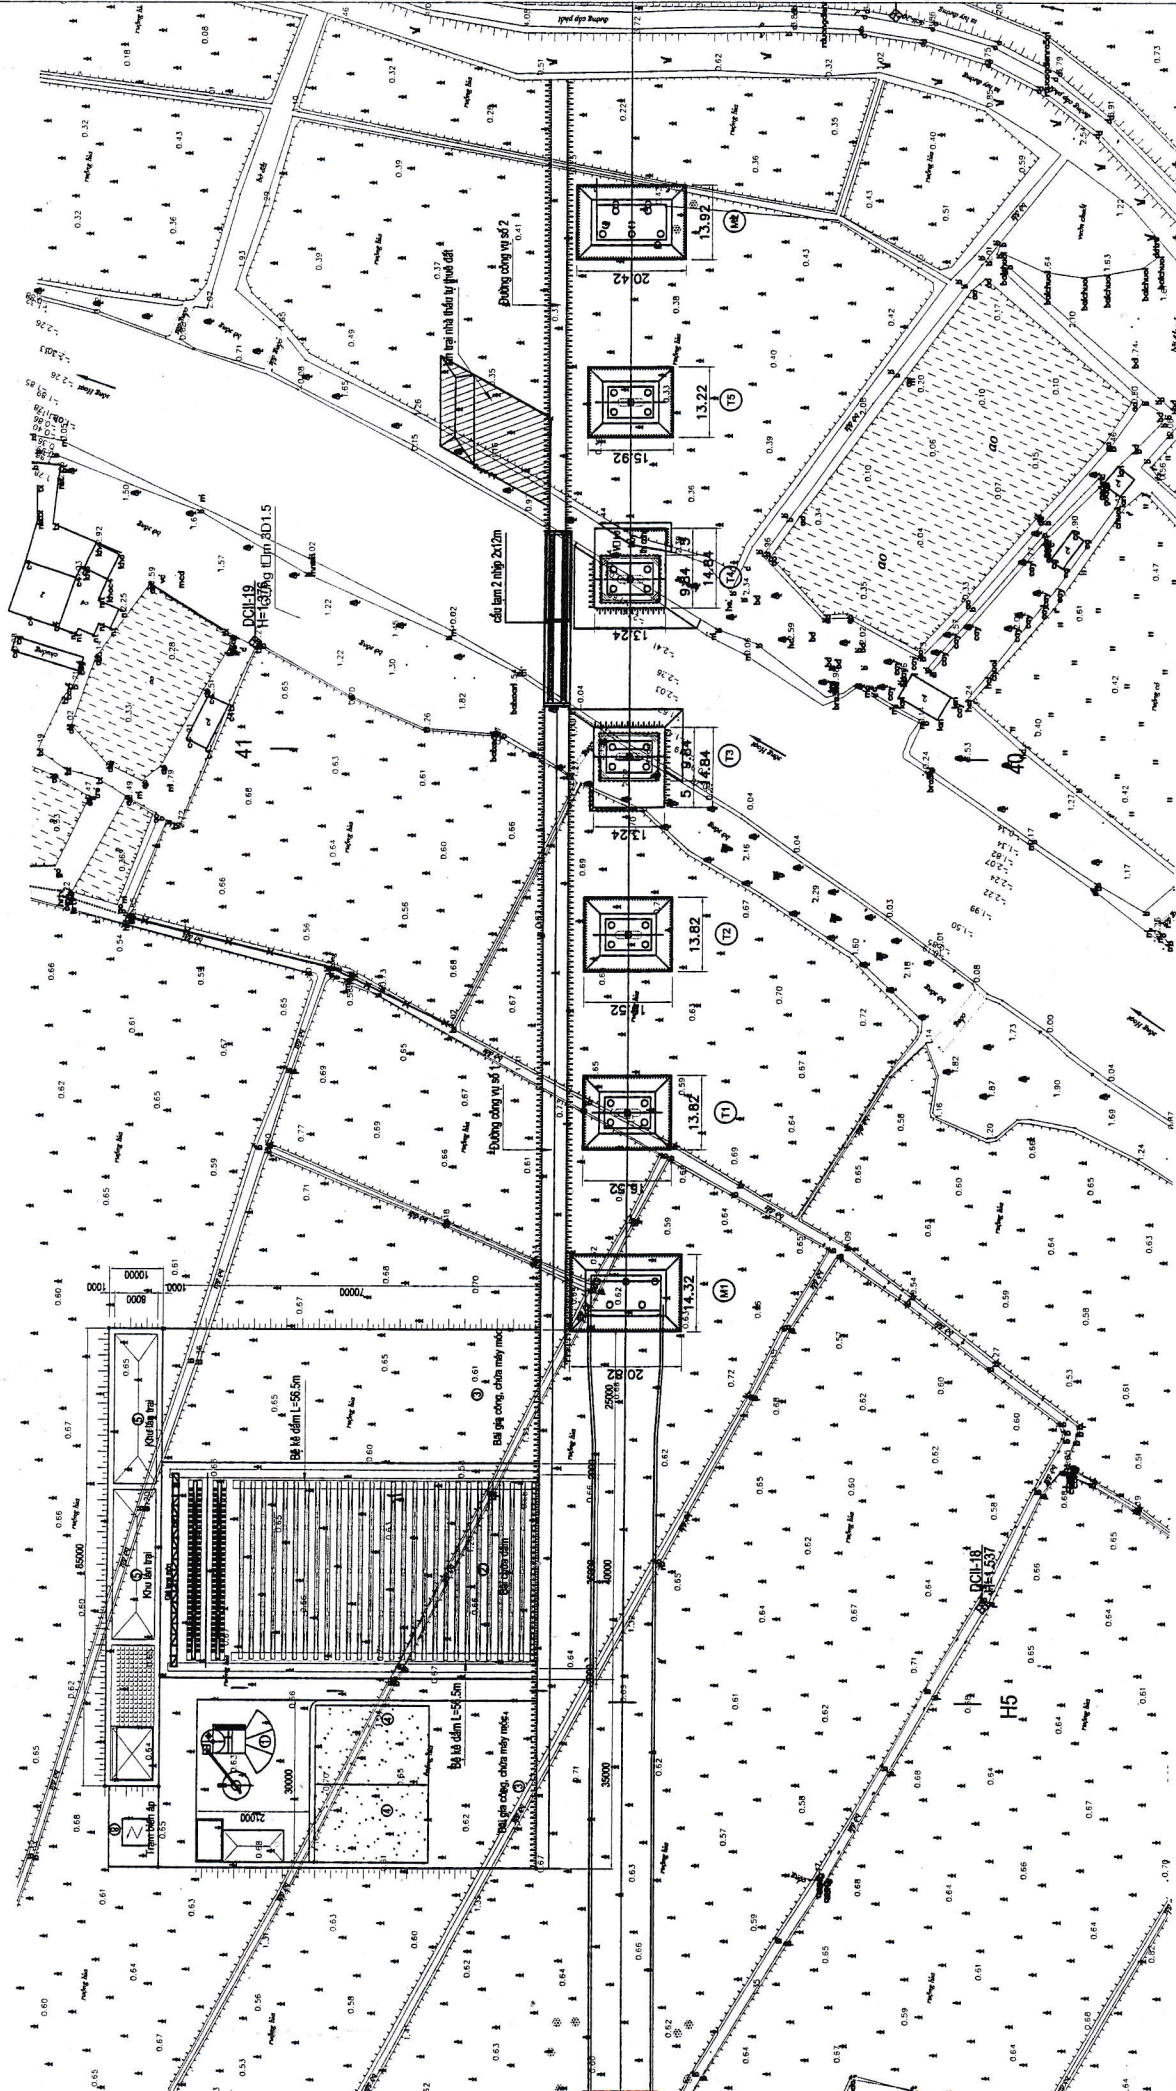

CHỦ ĐẦU TƯ	NHÀ THẦU XÂY LẬP : CÔNG TY CPXD CẦU THANH HÓA				TÊN BẢN VẼ	
UBND TỈNH THANH HÓA N QLDĐT CÔNG TRÌNH AO THÔNG THANH HÓA	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	NGÀY / THÁNG / NĂM	MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNG ĐƯỜNG TẠM CẦU TẠM	TỶ LỆ: LƯỚI TỌA ĐỘ: LƯỚI XÃ HỘI
	THỰC HIỆN	HOÀNG CÔNG THỤY				
	KIỂM TRA	HÀN MINH HIẾU				

DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG KẾT NỐI THỊ XÃ BÌM SƠN VÀ ĐƯỜNG BỘ
VEN BIỂN ĐOẠN NGÃ SƠN - HOÀNG HÓA
GỢI THẦU SỐ 06: THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH
HẠNG MỨC ĐƯỜNG TẠM, CẦU TẠM CẦU TUẦN GIANG - LÝ TRÌNH KM3+677.40
